

Avance de Ejecución Proyectos SGR

Informe de Regalías

Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Corte: 30 de septiembre de 2025

Liderazgo estratégico con visión neogranadina



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Indicadores Clave de Desempeño

5

Total de
Proyectos

3

Proyectos
Activos

2

Proyectos
Suspendidos

*

\$9.506

Inversión
SGR

*

\$3.431

Otras
Fuentes

*

\$12.937

Inversión
Total

73%

Avance
Promedio

* Cifras en millones de pesos

Avance Físico Promedio

73.01%


Avance Financiero Promedio

72.37%



Comparativa de Avances por Proyecto

■ Avance Físico ■ Avance Financiero

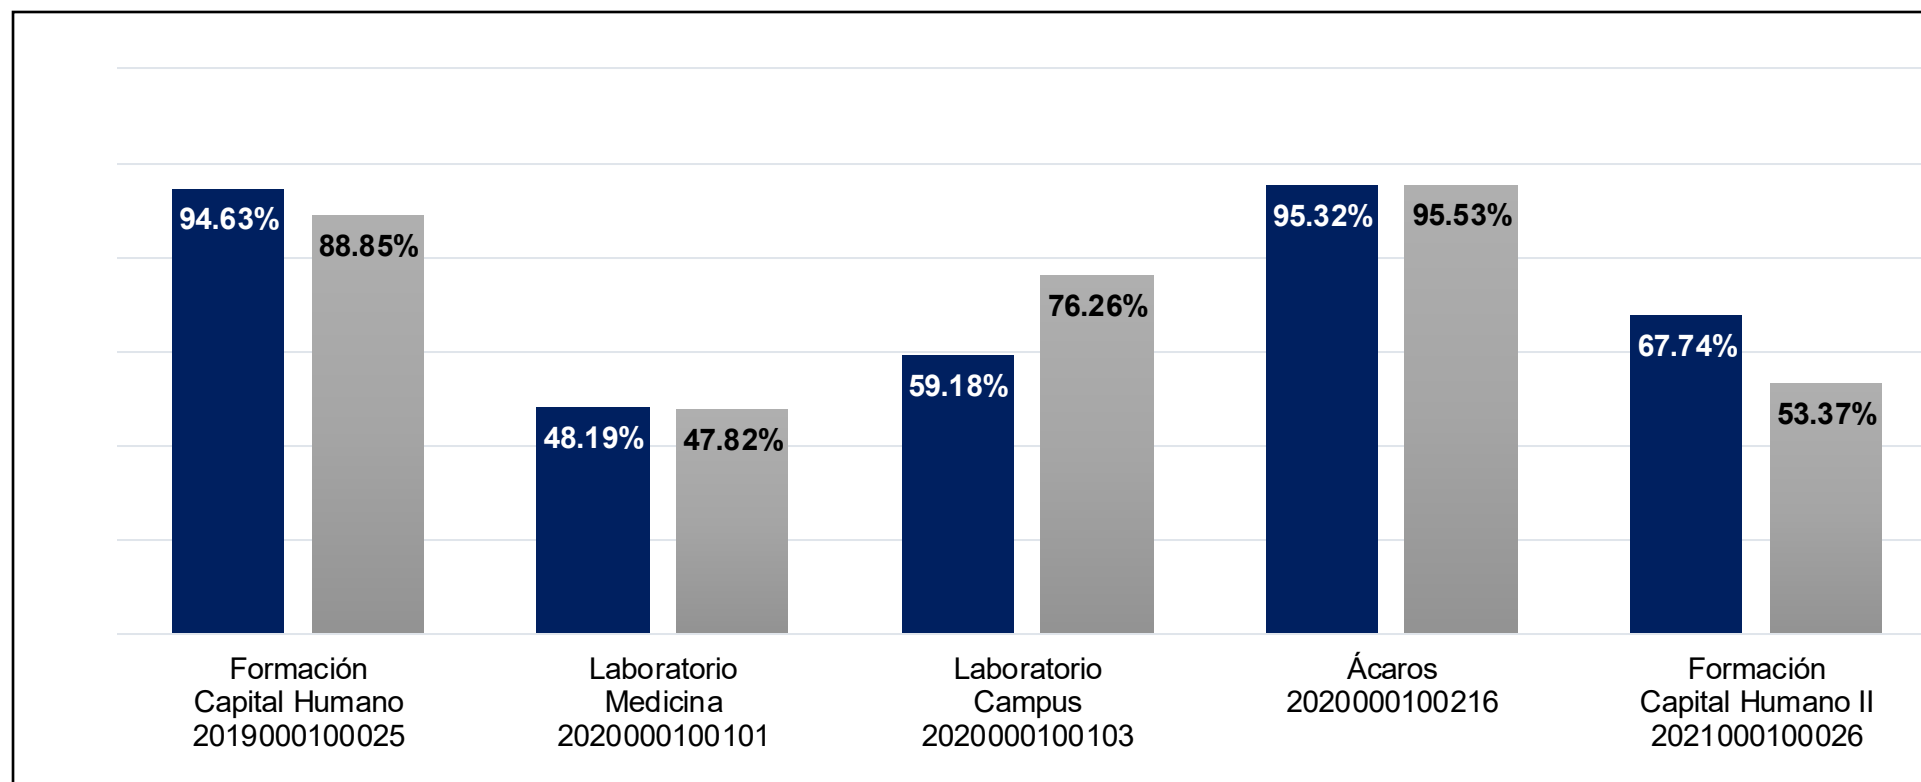



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

BPIN 2019000100025					FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA NACIONAL				
Fecha de Aprobación		Inicio de Actividades		Avance Físico 94,63%		Avance Financiero 88,85%		Fecha de corte <u>30 septiembre 2025</u>	
Diciembre 2019		Noviembre 2020							
Valor Total \$ 294.375.000		Valor SGR \$ 250.000.000		Otras Fuentes COLFUTURO - \$ 44.375.000 (Especie)					
ALCANCE		La formación de alto nivel en doctorado de un estudiante becario							
NOVEDADES CONTRACTUALES		En el marco de la ejecución se suscribió el Convenio 090720 con COLFUTURO para la administración y operación del becario.							
ESTADO ACTUAL		El proyecto se desarrolla sin inconvenientes, con un cumplimiento del 100% de la programación inicial y algunos ahorros en costos de matrículas y pasantías.							



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ				
BPIN 2020000100101	Fecha de Aprobación Mayo 2020	Inicio de Actividades Diciembre 2020	Avance Físico 48,19%	Avance Financiero 47,82%
				Fecha de corte <u>30 septiembre 2025</u>
	Valor total \$4.297.665.329	Valor SGR \$3.195.587.296	Otras Fuentes UMNG - \$1.102.078.033 (Especie)	
ALCANCE	Fortalecimiento de las capacidades de Ciencia y Tecnología del laboratorio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada, mediante la adecuación de la infraestructura física, dotación con equipos de última tecnología y fortalecimiento de recurso humano; con el fin de atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en Bogotá			
NOVEDADES CONTRACTUALES	En el marco de la ejecución se han suscrito 14 contratos: 13 de prestación de servicios y 1 para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento y adecuación del laboratorio.			
ESTADO ACTUAL	El proyecto se encuentra suspendido, por dificultades relacionadas con la adecuación y adquisición de los elementos que le permitieran funcionar de acuerdo con las características esperadas en la etapa de formulación.			



**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA**

BPIN
2020000100103

**Fecha de
Aprobación**

Mayo 2020

**Inicio de
Actividades**

Diciembre 2020

Avance Físico
59,18%

Avance Financiero
76,26%

Fecha de corte
30 septiembre 2025

Valor total
\$5.162.742.977

Valor SGR
\$4.168.513.565

Otras Fuentes
UMNG - \$994.229.412 (Especie)

ALCANCE

Fortalecimiento de las capacidades de Ciencia y Tecnología del laboratorio de diagnóstico en el Campus Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada, mediante la adecuación física, dotación con equipos de última tecnología y capacitación de recurso humano; con el fin de atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en Cundinamarca

**NOVEDADES
CONTRACTUALES**

En el marco de la ejecución se han suscrito 14 contratos: 13 de prestación de servicios y 1 para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento y adecuación del laboratorio.

ESTADO ACTUAL

El proyecto se encuentra suspendido, por dificultades relacionadas con la adecuación y adquisición de los elementos que le permitieran funcionar de acuerdo con las características esperadas en la etapa de formulación.



BPIN
2020000100216

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE UMNGBIO A PRODUCTORES DE FLORES PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE TETRANYCHUS URTICAE (ACARI: TETRANYCHIIDAE) EN CULTIVOS DE INVERNADERO CON EL ÁCARO BENÉFICO NEOSEIULUS CALIFORNICUS (ACARI: PHYTOSEIIDAE) CUNDINAMARCA

Fecha de Aprobación
Noviembre de 2020

Inicio de Actividades
Junio de 2021

Avance Físico
95,32%

Avance Financiero
95,53%

Fecha de corte
30 septiembre 2025

Valor total
\$2.431.580.000

Valor SGR
\$1.241.580.000

Otras Fuentes
UMNG - \$1.190.000.000 (\$1.153.340.140 en especie y \$36.659.860 en dinero)

ALCANCE

Innovación y transferencia tecnológica de UMNGBIO a productores de flores, mediante el desarrollo del proceso de producción de ácaros depredadores de N. californicus para reducción del uso intensivo de agrotóxicos y validación en escenarios comerciales como alternativa biológica para el control biológico de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) en cultivos de invernadero con el ácaro benéfico Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) en Cundinamarca.

NOVEDADES CONTRACTUALES

En el marco de la ejecución se han suscrito 23 contratos, de los cuales 8 requirieron prórrogas. Al corte, no hay contratos en ejecución, solo actividades de aporte en especie por parte de la UMNG.

ESTADO ACTUAL

El proyecto se encuentra en ejecución, con desempeño adecuado de acuerdo con la programación actual. Solo queda pendiente culminar con la actividad “Obtención de registros de producción y protección de la tecnología”, que requiere la adecuación de espacios para poder obtener los registros ICA respectivos. Se estima la terminación de las actividades, en el primer semestre del 2026.



BPIN
2021000100026

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA SEGUNDO CORTE NACIONAL

Fecha de Aprobación	Inicio de Actividades	Avance Físico 67,74%		Avance Financiero 53,37%	Fecha de corte <u>30 septiembre 2025</u>
Junio 2021	Noviembre 2020				
Valor total \$751.632.481	Valor SGR \$650.602.304	Otras Fuentes COLFUTURO - \$44.375.000 (Especie) UMNG: \$56.655.177 (Especie)			
ALCANCE	Formación de Capital Humano de Alto Nivel mediante la financiación de 3 créditos-beca a nivel de Doctorado, para fortalecer las capacidades científicas de los departamentos de Cundinamarca y Huila				
NOVEDADES CONTRACTUALES	En el marco de la ejecución se suscribió el Convenio No. 2 de 2021 con COLFUTURO con el objeto de “Aunar esfuerzos para la operación de los créditos educativos condonables en el marco del programa de becas excelencia doctoral bicentenario celebrado entre la UMNG y la Fundación para el futuro de Colombia – Colfuturo. Con ese propósito los esfuerzos se dirigirán a los procesos de legalización, seguimiento académico y financiero, periodo de condonación y de gestión para la recuperación de cartera de los citados créditos educativos otorgados a los beneficiarios”.				
ESTADO ACTUAL	Al corte 1 de los 3 becarios decidió retirarse de su programa doctoral, por lo que ha debido reintegrar los dineros que se invirtieron en su educación. Sin embargo, el proyecto se ejecuta de forma adecuada con un cumplimiento de la programación del 98%, y ahorros en los gastos de matrículas y pasantías.				



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Información de Contacto

Institución

Universidad Militar Nueva Granada

Informe Elaborado por:

Oficina Asesora de Planeación Estratégica

Fecha de Corte

30 de septiembre de 2025

Próxima Actualización

Diciembre 2025

Nota: Este informe presenta el estado de ejecución de los proyectos de regalías según información disponible al 30 de septiembre de 2025. Para consultas adicionales o información detallada, contactar a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica.



¡Gracias!



Liderazgo estratégico con visión neogranadina
